

P-DE-E-179-CIV18-000-003 — AIR SEPARATION UNIT MASTER PLAN | Terraplanagem — Planta | OTZ PGE | Aprov.: RNW | 19/08/25

Ref: CLM-216

Contratada: Andrade e Rocha (DAENG)

Gerenciadora: OTZ Engenharia — GPLAN

Levantamento: 02/07/2026

Elaborado por: Caio Sergio Bento da Silva & Ilson do Santos Azevedo

REV3 — 11/07/2026

◆ INDICADORES GERAIS



49

LOCAIS / CARDS



225

TOTAL
ATIVIDADES



132

CONCLUÍDAS



93

PENDENTES



+0.3 pp

DEFASAGEM
CURVA-S
Adiantado — Prev:
58%



7

DIAS EM ABERTO
úteis desde 04/07/2026



18.9 atv/dia

VELOCIDADE



17/07/2026


DATA DE TENDÊNCIA
✓ Dentro do prazo | ritmo: 18.9 atv/dia



◆ ATIVIDADES POR DISCIPLINA — AVANÇO FÍSICO

Macro drenagem		63/110	57%
Geral / SS		25/41	61%
Plantio de Grama		28/30	93%
Terraplanagem		12/29	41%
CFTV		4/15	27%
Data Book		ENTREGÁVEL	17/07/26

◆ CURVA-S — PREVISTO × REALIZADO

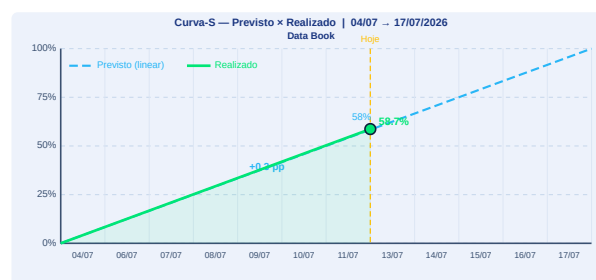

ANTES / LEVANTAMENTO

Junção ASU x CDC



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1710S/46.9501W
- 🕒 15:14 — 02/07/2026
- 📍 Av. Pref. Luís Latorre, 9600 — Setor Industrial, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Desforma da Escada 1	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Recolocação da canaleta na Berma da escada	3	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Acabamento final da superfície da escada (nata de cimento)	5	Pendente	—
4	● Terraplanagem	Recomposição do talude / recompactação do solo próximo à Escada 1	5	Concluída	100%
5	● Plantio de Grama	Plantio de grama na região da Escada 1	3	Concluída	100%
6	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



⊕ 23.1710S/46.9501W

🕒 15:16 — 02/07/2026

📍 Av. Pref. Luís Latorre, 9600 — Setor Industrial, Jundiaí/SP

100%

AVANÇO FÍSICO

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e compactação na região da canaleta de interligação	3	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Corte da crista do talude para padronização da Berma da calha	2	Concluída	100%
3	● Plantio de Grama	Plantio de grama da base até a crista do talude	3	Concluída	100%
4	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Talude / Berma / Platô — Portaria Provisória



2 de jul. de 2026 15:34:24
23,1706S 46,9497W
9600 Avenida Prefeito Luís Latorre
Setor Industrial
Jundiaí
São Paulo

Foto 1 de 1

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1706S/46.9497W
- 🕒 15:34 — 02/07/2026
- 📍 Av. Pref. Luís Latorre, 9600 — Setor Industrial, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Terraplanagem	Recomposição do talude / compactação do platô	3	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Plantio de Grama	Replantio de grama no talude (trecho com lacunas de solo exposto)	3	Concluída	100%
3	● Terraplanagem	Acerto do terreno superficial da Berma	2	Concluída	100%
4	● Terraplanagem	Acerto do terreno superficial do platô	2	Concluída	100%
5	● Macrodrenagem	Aterrar e compactar as laterais da canaleta da Berma	2	Concluída	100%
6	● Macrodrenagem	Rejuntamento com argamassa mista (traço 1:3) nas canaletas	3	Concluída	100%
7	● Macrodrenagem	Recolocação da placa de obra	2	Concluída	100%
8	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra do platô	4	Concluída	100%
9	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	2	Concluída	100%

CARD 04

Local 04

Área Perimetral da Escada 2

86%

8 concl.

1 pend.

ANTES / LEVANTAMENTO

Área Perimetral da Escada 2



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1703S/46.9492W

🕒 15:51 — 02/07/2026

📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 2045 — Chácara Terra Nova, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Terraplanagem	Acerto e aterro no platô abaixo da berma (laterais da Escada 2) com compactação	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Rejuntamento (traço 1:3) na canaleta da berma + compactação das laterais	5	Concluída	100%
3	● Terraplanagem	Recomposição do talude / recompactação do solo em relação ao platô	5	Concluída	100%
4	● Macrodrenagem	Nivelamento do platô — canaleta: aterro, compactação e cimentação (traço 1:3)	5	Pendente	—
5	● Plantio de Grama	Replanteio de grama em toda a região perimetral da Escada 2	3	Concluída	100%
6	● Plantio de Grama	Replanteio de grama nas laterais da escada e das canaletas	3	Concluída	100%
7	● Geral / 5S	Remoção do excedente de terra do platô	4	Concluída	100%
8	● Geral / 5S	Remoção das estacas de madeira	3	Concluída	100%
9	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	2	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Terraplanagem	Recomposição do solo e recompactação do talude	3	Concluída	100%
3	● Plantio de Grama	Replantio de grama em todo o talude em curva	3	Concluída	100%
4	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Superfície da Berma — Cota 691



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1703S/46.9492W
- 🕒 16:00 — 02/07/2026
- 📍 Av. Pref. Luís Latorre, 9600 — Setor Industrial, Jundiaí/SP




#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Remoção de todo o solo excedente das atividades de macrodrenagem da Berma	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Remoção das sobras de canaleta e demais materiais residuais	2	Concluída	100%
3	● Geral / 5S	Organização e limpeza geral da área da Berma (cota 691)	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Superfície da Berma — Cota 691

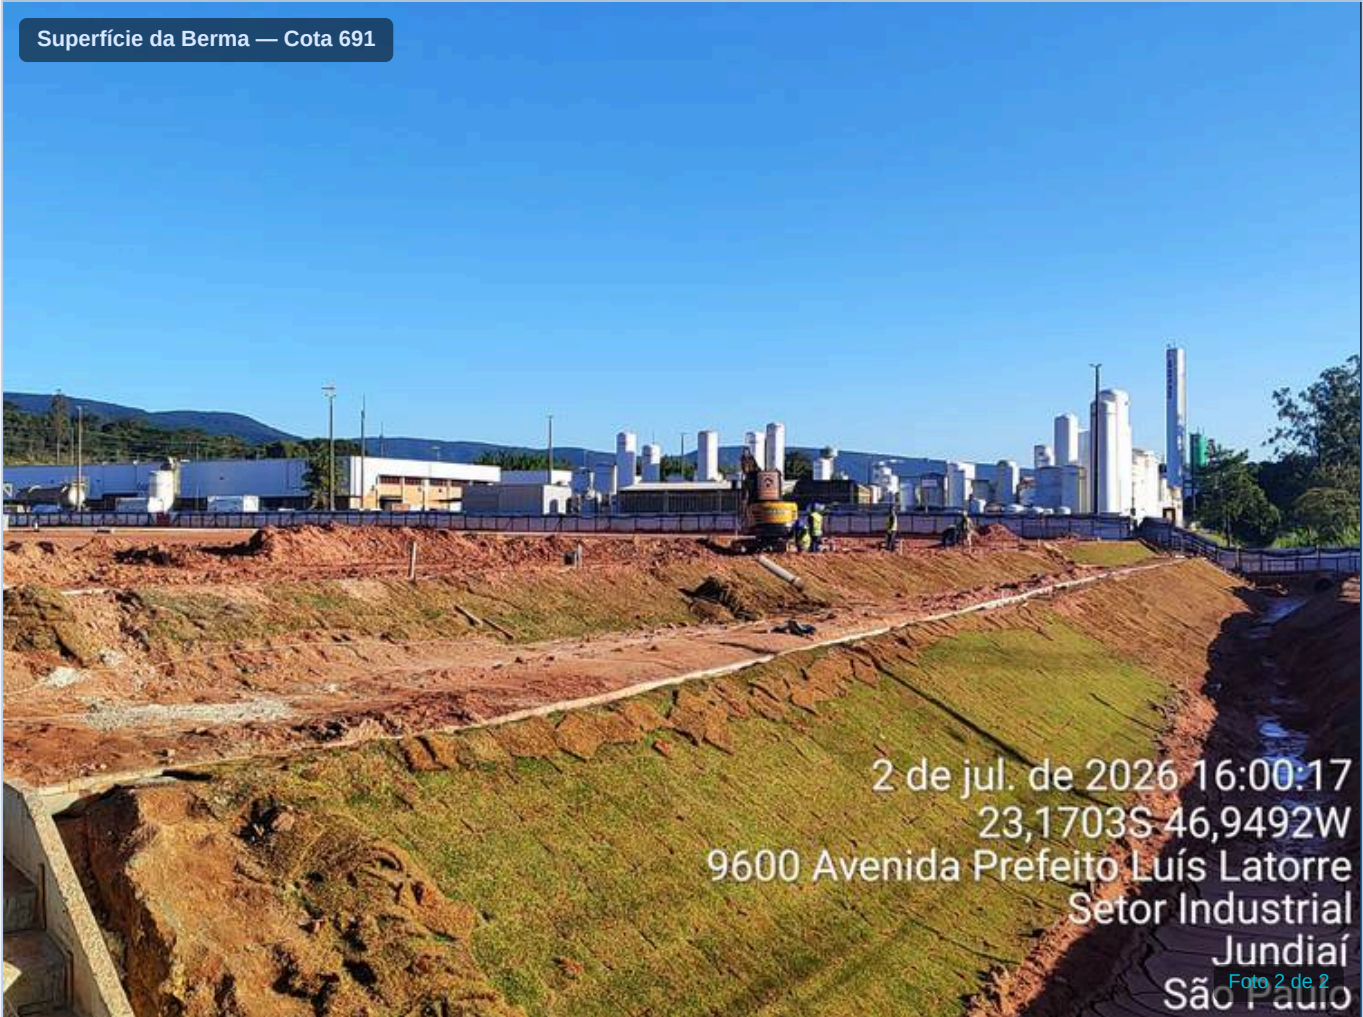

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1703S/46.9492W

🕒 16:00 — 02/07/2026

📍 Av. Pref. Luís Latorre, 9600 — Setor Industrial, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Remoção de todo o solo excedente das atividades de macrodrenagem da Berma	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Remoção das sobras de canaleta e demais materiais residuais	2	Concluída	100%
3	● Geral / 5S	Organização e limpeza geral da área da Berma (cota 691)	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Talude do Platô — Frente à Bacia



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1702S/46.9491W

🕒 16:06 — 02/07/2026

📍 Av. Pref. Luís Latorre, 9450–9600 — Setor Industrial, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Plantio de Grama	Replanteio de toda a grama no talude do platô em frente à bacia	3	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Geral / 5S	Remoção do entulho das canaletas	2	Concluída	100%
3	● Geral / 5S	Remoção de madeira	2	Concluída	100%
4	● Geral / 5S	Remoção de grama excedente e limpeza geral da área	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Escada 3 — Portaria Definitiva do Projeto ASU



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão


- ⊕ 23.1702S/46.9483W
- ⌚ 16:14 — 02/07/2026
- 📍 Rua Emílio Antonon, 1680 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Desforma da Escada 3	4	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Reaterro com compactação das faces laterais da Escada 3	5	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Nivelamento com aterro na parte frontal da escada em relação à rua	5	Concluída	100%
4	● Macrodrenagem	Aplicação de argamassa superficial de regularização da Escada 3	4	Pendente	—
5	● Plantio de Grama	Recomposição de grama nas áreas adjacentes à Escada 3	3	Concluída	100%
6	● Geral / 5S	Limpeza geral e remoção de entulho e resíduos de concretagem	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO

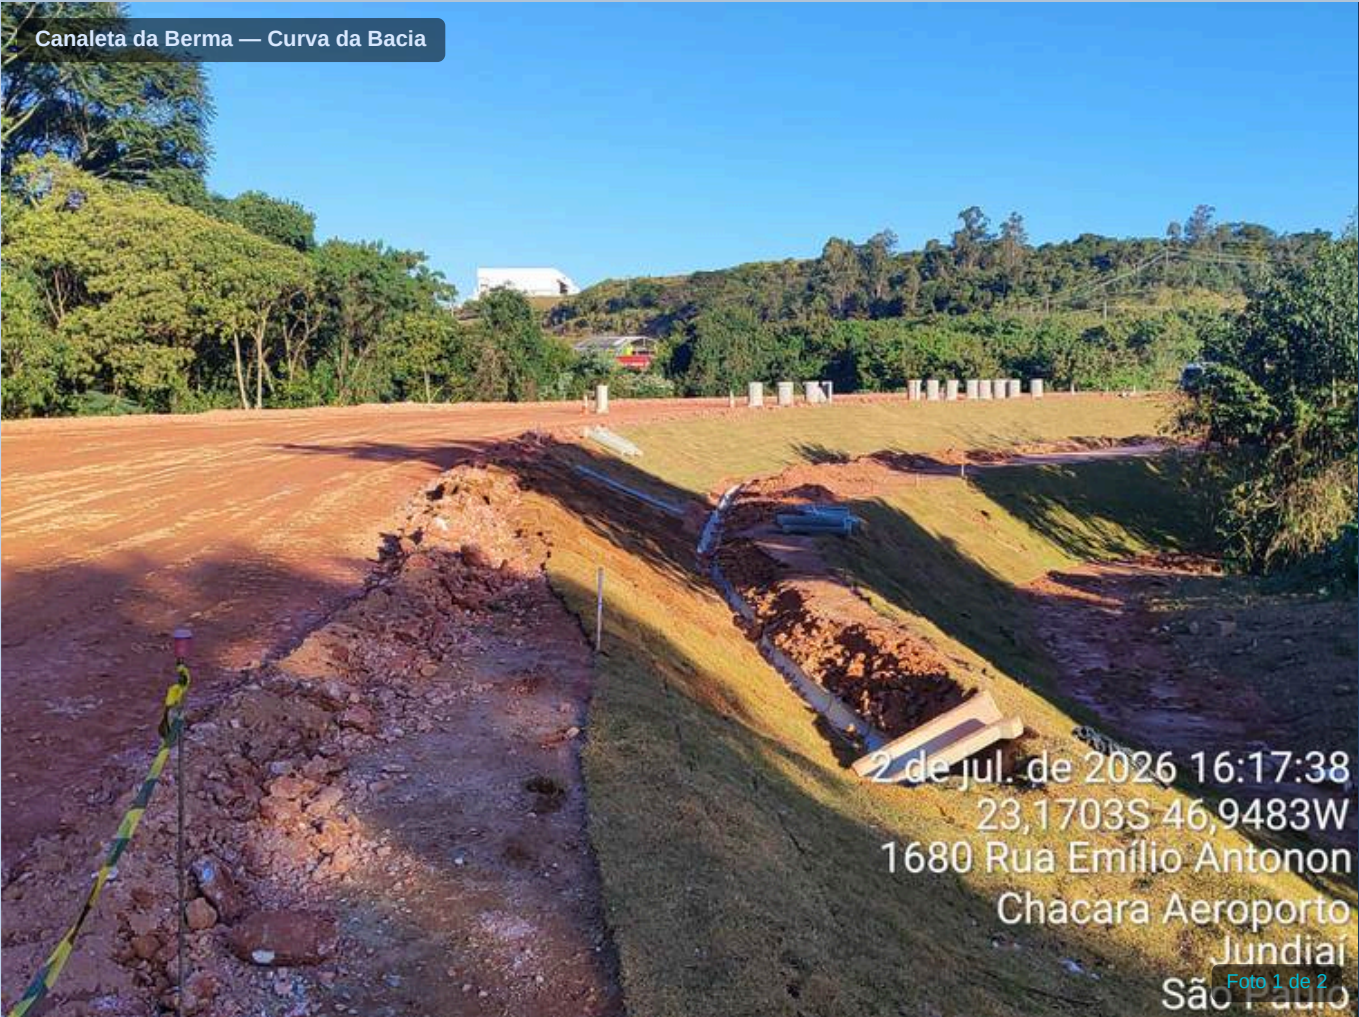

PÓS / REALIZADO



⊕ 23.1703S/46.9483W

⌚ 16:17 — 02/07/2026

📍 Rua Emílio Antonon, 1680 / Av. Pref. Luís Latorre, 2067 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Remoção das canaletas da berma instaladas com problema de nivelamento	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Nivelamento superficial da base da vala da berma	5	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Acerto do nível e compactação da Berma em relação à canaleta	5	Concluída	100%
4	● Macrodrenagem	Reinstalação das canaletas da berma com nivelamento correto	5	Concluída	100%
5	● Macrodrenagem	Impermeabilização interna das canaletas	3	Concluída	100%
6	● Macrodrenagem	Aplicação de argamassa de regularização (traço 1:3) nas canaletas	4	Concluída	100%
7	● Geral / 5S	Limpeza geral e remoção de entulho e resíduos da vala	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



⊕ 23.1703S/46.9483W

🕒 16:21 — 02/07/2026

📍 Rua Emílio Antonon, 1680 — Chácara Aeroporto, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Plantio de Grama	Remoção das gramas mal instaladas e deslocadas do talude	3	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Terraplanagem	Nivelamento e compactação do solo do talude	4	Pendente	—
3	● Plantio de Grama	Replantio de grama em todo o talude da curva da bacia	3	Pendente	—
4	● Geral / 5S	Remoção de lona e resíduos do talude; limpeza geral da área	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1703S/46.9483W

🕒 16:21 — 02/07/2026

📍 Rua Emílio Antonon, 1680 — Chácara Aeroporto, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Plantio de Grama	Remoção das gramas mal instaladas e deslocadas do talude	3	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Terraplanagem	Nivelamento e compactação do solo do talude	4	Concluída	100%
3	● Plantio de Grama	Replantio de grama em todo o talude da curva da bacia	3	Concluída	100%
4	● Geral / 5S	Remoção de lona e resíduos do talude; limpeza geral da área	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Berma Externa — Acompanhamento da Rua




PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W
- 🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026
- 📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Reaterro na face lateral da canaleta de 50cm	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Recompactação do solo nas laterais da canaleta	5	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Limpeza interna da canaleta (remoção de sedimento acumulado)	2	Concluída	100%
4	● Macrodrenagem	Aplicação de argamassa de regularização (traço 1:3) nas juntas	4	Concluída	100%
5	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	5	Pendente	—
6	● Macrodrenagem	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Pendente	—
7	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	3	Pendente	—
8	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	3	Pendente	—
9	● Macrodrenagem	Replanteio de grama na Berma e berma externa	3	Pendente	—
10	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	1	Concluída	100%
11	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W

🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026

📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Reaterro na face lateral da canaleta de 50cm	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Recompactação do solo nas laterais da canaleta	5	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Limpeza interna da canaleta (remoção de sedimento acumulado)	2	Concluída	100%
4	● Macrodrenagem	Aplicação de argamassa de regularização (traço 1:3) nas juntas	5	Concluída	100%
5	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	5	Concluída	100%
6	● Macrodrenagem	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Pendente	—
7	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	3	Pendente	—
8	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	3	Pendente	—
9	● Macrodrenagem	Replanteio de grama na Berma e berma externa	3	Pendente	—
10	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	2	Concluída	100%
11	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W
- 🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026
- 📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Pendente	—
3	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	3	Pendente	—
4	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	3	Pendente	—
5	● Macrodrenagem	Replântio de grama na Berma e berma externa	3	Pendente	—
6	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	3	Pendente	—
7	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO

Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W

🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026

📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Reaterro na face lateral da canaleta de 50cm	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Recompactação do solo nas laterais da canaleta	5	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Limpeza interna da canaleta (remoção de sedimento acumulado)	3	Concluída	100%
4	● Macrodrenagem	Aplicação de argamassa de regularização (traço 1:3) nas juntas	5	Concluída	100%
5	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	5	Concluída	100%
6	● Macrodrenagem	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Pendente	—
7	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	3	Pendente	—
8	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	3	Pendente	—
9	● Macrodrenagem	Replanteio de grama na Berma e berma externa	3	Pendente	—
10	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	5	Concluída	100%
11	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO


Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W

🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026

📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	5	Pendente	28.6%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Pendente	—
3	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	3	Pendente	—
4	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	3	Pendente	—
5	● Macrodrenagem	Replanteio de grama na Berma e berma externa	3	Pendente	—
6	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	5	Concluída	100%
7	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W
- 🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026
- 📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	3	Pendente	28.6%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Pendente	—
3	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	3	Concluída	100%
4	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	3	Pendente	—
5	● Macrodrenagem	Replanteio de grama na Berma e berma externa	3	Concluída	100%
6	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	5	Concluída	100%
7	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO

Berma Externa — Acompanhamento da Rua



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W
- 🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026
- 📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Reaterro na face lateral da canaleta de 50cm	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Recompactação do solo nas laterais da canaleta	5	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Limpeza interna da canaleta (remoção de sedimento acumulado)	3	Concluída	100%
4	● Macrodrenagem	Aplicação de argamassa de regularização (traço 1:3) nas juntas	5	Concluída	100%
5	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	5	Pendente	—
6	● Macrodrenagem	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Concluída	100%
7	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	3	Pendente	—
8	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	3	Pendente	—
9	● Macrodrenagem	Replanteio de grama na Berma e berma externa	3	Concluída	100%
10	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	5	Concluída	100%
11	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W
- 🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026
- 📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	5	Pendente	28.6%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	3	Pendente	—
4	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	3	Pendente	—
5	● Macrodrenagem	Replanteio de grama na Berma e berma externa	3	Concluída	100%
6	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	5	Pendente	—
7	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO

Berma Externa — Acompanhamento da Rua



2 de jul. de 2026 16:32:11
23,1708S 46,9479W
120 Rua Nancy Carlota Netto
Parque Residencial Eloy Chaves
Jundiaí
São Paulo

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W
- 🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026
- 📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	5	Pendente	28.6%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	3	Pendente	—
4	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	3	Pendente	—
5	● Macrodrenagem	Replântio de grama na Berma e berma externa	3	Concluída	100%
6	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	5	Pendente	—
7	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W
- 🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026
- 📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	5	Pendente	28.6%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Plantio de Grama	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	3	Pendente	—
4	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	3	Pendente	—
5	● Plantio de Grama	Replantio de grama na Berma e berma externa	3	Concluída	100%
6	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	3	Pendente	—
7	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO

Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1702–23.1715S/46.9479–46.9483W

🕒 16:25–16:30 — 02/07/2026

📍 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 982 / Rua Nancy Carlota Netto, 120 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Reaterro na face lateral da canaleta de 50cm	5	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Macrodrenagem	Recompactação do solo nas laterais da canaleta	5	Concluída	100%
3	● Macrodrenagem	Limpeza interna da canaleta (remoção de sedimento acumulado)	2	Concluída	100%
4	● Macrodrenagem	Aplicação de argamassa de regularização (traço 1:3) nas juntas	3	Concluída	100%
5	● Macrodrenagem	Acerto no nivelamento da crista da Berma	2	Pendente	—
6	● Plantio de Grama	Remoção da grama sobre pontos de subsidência e buracos na Berma	3	Concluída	100%
7	● Macrodrenagem	Recomposição do solo e nivelamento nos pontos de buraco/cavidade	2	Pendente	—
8	● Macrodrenagem	Compactação do solo nos pontos recompostos	2	Pendente	—
9	● Plantio de Grama	Replanteio de grama na Berma e berma externa	3	Concluída	100%
10	● Macrodrenagem	Remoção do excedente de terra da berma	3	Concluída	100%
11	● Geral / 5S	Limpeza geral e organização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



⊕ 23.1717S/46.9482W

🕒 16:37 — 02/07/2026

📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Medeiros, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Terraplanagem	Corte do aterro	3	Pendente	0.0%
2	● Terraplanagem	Nivelamento do solo	3	Pendente	—

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
3	● Terraplanagem	Compactação do solo	3	Pendente	—
4	● Plantio de Grama	Plantio de grama	3	Pendente	—
5	● Terraplanagem	Remoção de excedente de materiais	2	Pendente	—
6	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	2	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO

Platô — Área de Tancagem



2 de jul. de 2026 16:42:06
23,1718S 46,9481W
1680 Rua Emílio Antonon
Chacara Aeroporto
Jundiaí
São Paulo

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1718S/46.9481–46.9482W
🕒 16:42 — 02/07/2026
📍 Rua Emílio Antonon, 1680 — Chácara Aeroporto, Jundiaí/SP




#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Terraplanagem	Aplicação de água com caminhão pipa	3	Pendente	0.0%
2	● Terraplanagem	Nivelamento superficial da superfície	3	Pendente	—

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
3	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Platô — Área de Tancagem

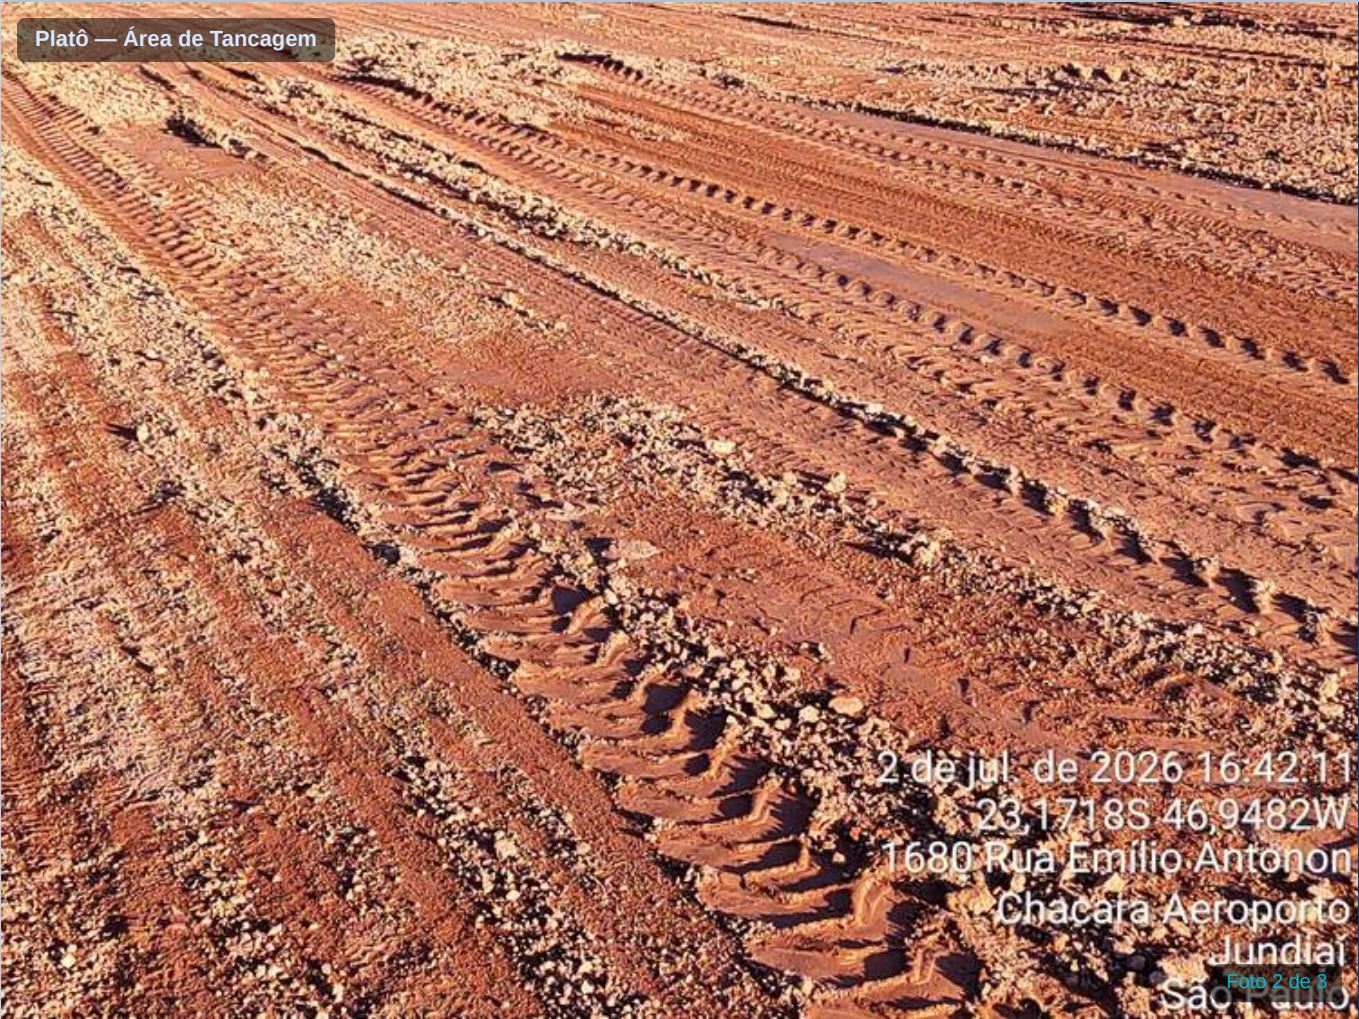

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1718S/46.9481–46.9482W

🕒 16:42 — 02/07/2026

📍 Rua Emílio Antonon, 1680 — Chácara Aeroporto, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Terraplanagem	Aplicação de água com caminhão pipa	3	Pendente	0.0%
2	● Terraplanagem	Nivelamento superficial da superfície	3	Pendente	—

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
3	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1718S/46.9481–46.9482W

🕒 16:42 — 02/07/2026

📍 Rua Emílio Antonon, 1680 — Chácara Aeroporto, Jundiaí/SP




#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Terraplanagem	Aplicação de água com caminhão pipa	3	Pendente	0.0%
2	● Terraplanagem	Nivelamento superficial da superfície	3	Pendente	—

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
3	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	2	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Talude do Fundo da Obra

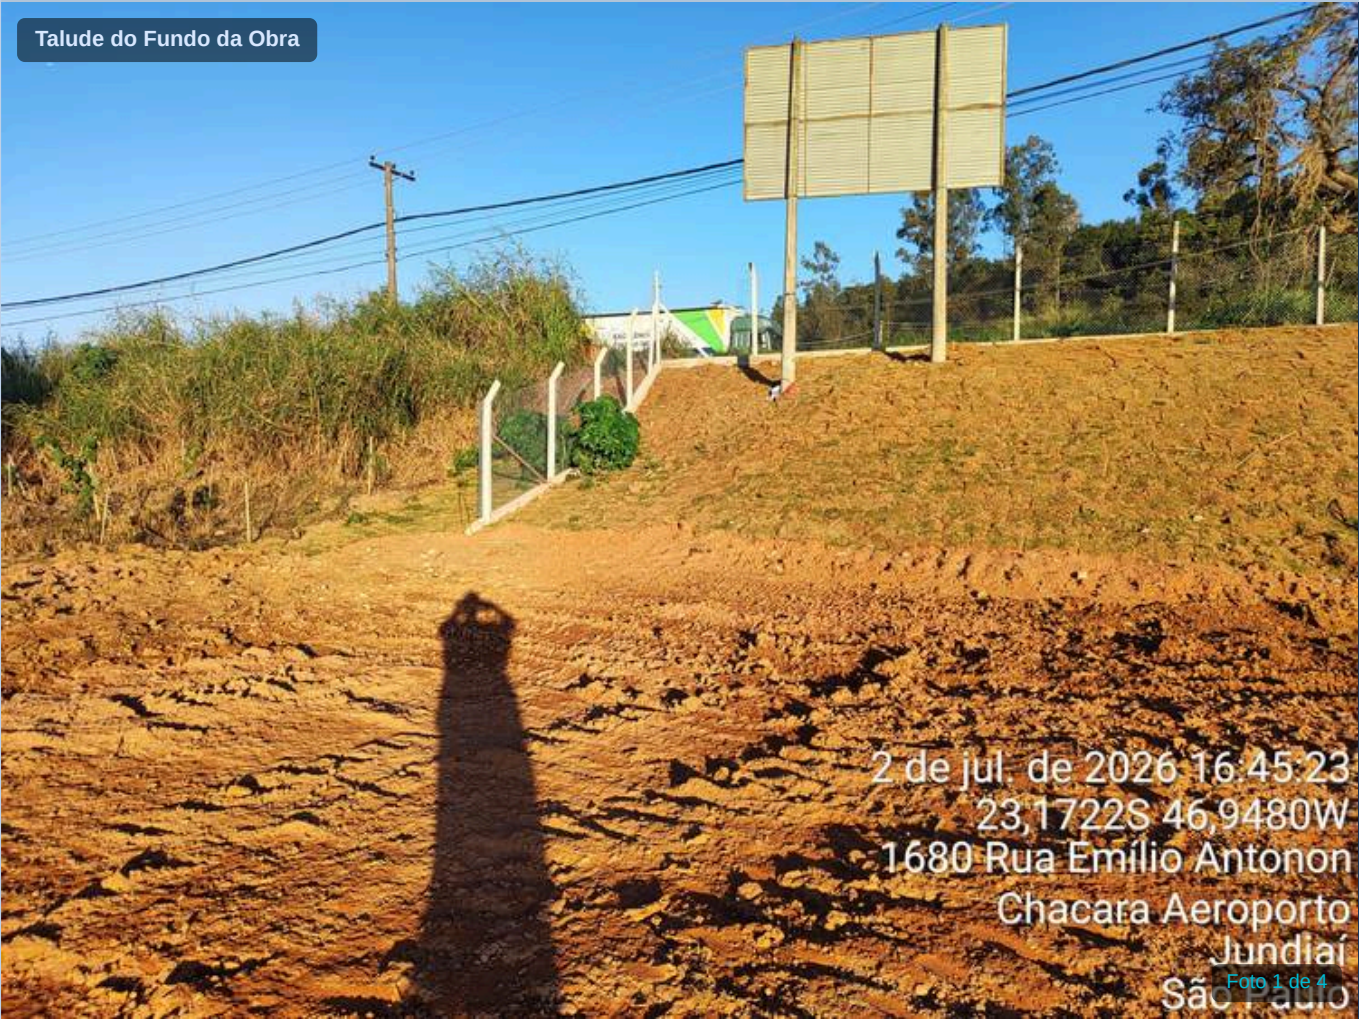

2 de jul. de 2026 16:45:23
23,1722S 46,9480W
1680 Rua Emílio Antonon
Chacara Aeroporto
Jundiaí
São Paulo

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1721–23.1722S/46.9480W
🕒 16:45 — 02/07/2026
📍 Rua Emílio Antonon, 1680 / Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Jundiaí/SP




#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Plantio de Grama	Realinhamento da grama	3	Concluída	100%
2	● Plantio de Grama	Plantio de grama no pé do talude	3	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
3	● Plantio de Grama	Remoção de gramas mal instaladas	3	Concluída	100%
4	● Terraplanagem	Nivelamento do solo	3	Pendente	—
5	● Plantio de Grama	Replantio das gramas mal instaladas	3	Concluída	100%
6	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	1	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO

Talude do Fundo da Obra

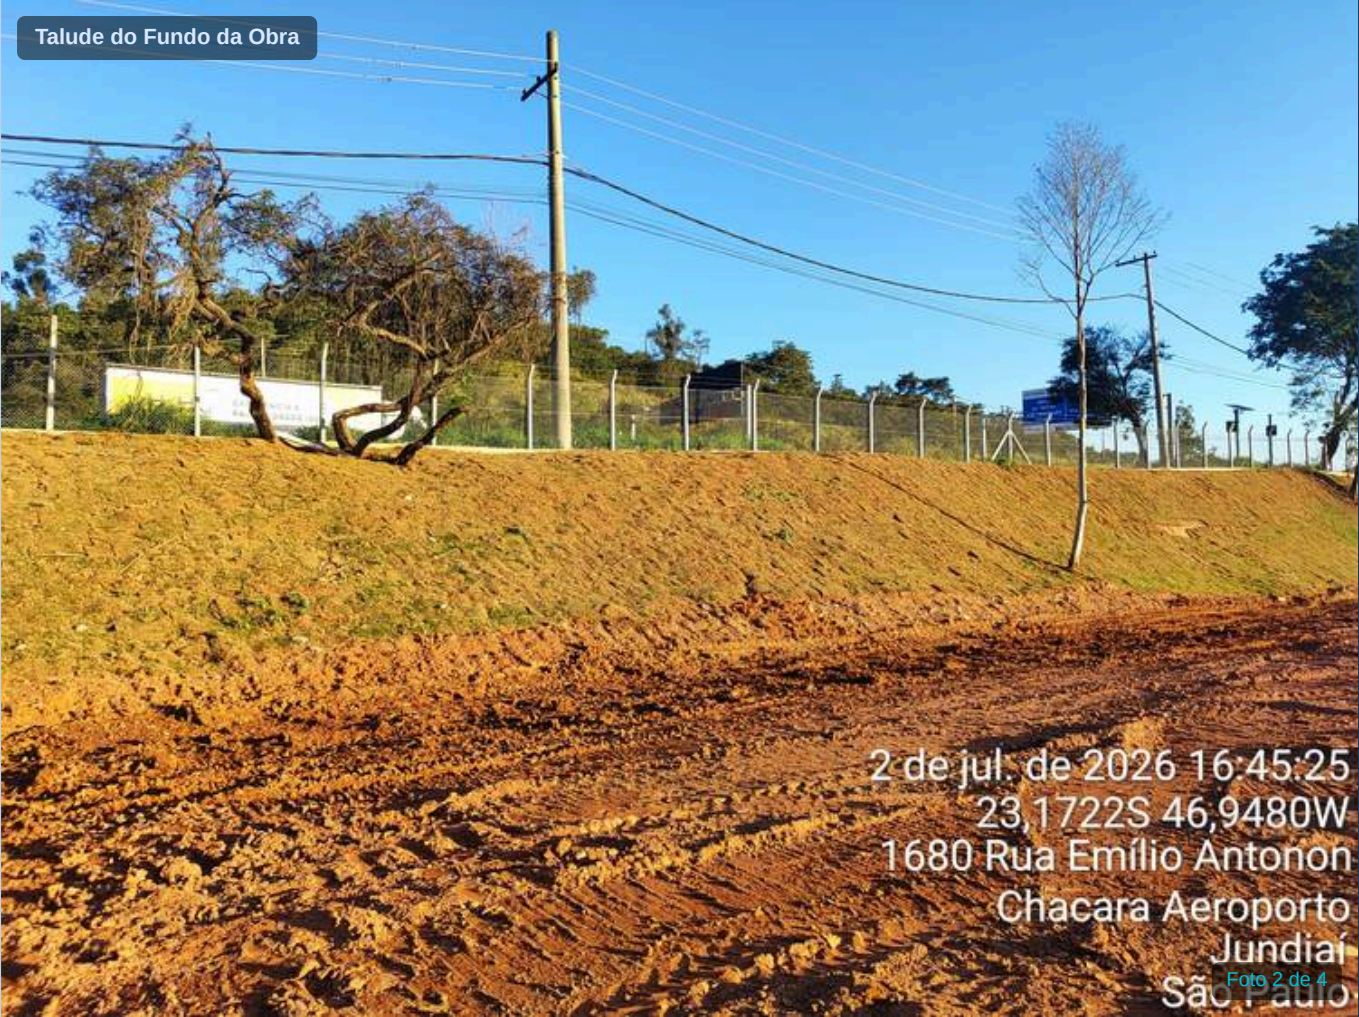

2 de jul. de 2026 16:45:25
23,1722S 46,9480W
1680 Rua Emílio Antonon
Chacara Aeroporto
Jundiaí
São Paulo

Foto 2 de 4

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1721–23.1722S/46.9480W
🕒 16:45 — 02/07/2026
📍 Rua Emílio Antonon, 1680 / Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Plantio de Grama	Realinhamento da grama	3	Concluída	100%
2	● Plantio de Grama	Plantio de grama no pé do talude	3	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
3	● Plantio de Grama	Remoção de gramas mal instaladas	3	Concluída	100%
4	● Terraplanagem	Nivelamento do solo	3	Pendente	—
5	● Plantio de Grama	Replante das gramas mal instaladas	3	Concluída	100%
6	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	1	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO

Talude do Fundo da Obra



2 de jul. de 2026 16:45:39
23,1721S 46,9480W
11010 Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto
Medeiros
Jundiaí
São Paulo

Foto 3 de 4

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1721–23.1722S/46.9480W
- 🕒 16:45 — 02/07/2026
- 📍 Rua Emílio Antonon, 1680 / Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Plantio de Grama	Realinhamento da grama	3	Concluída	100%
2	● Plantio de Grama	Plantio de grama no pé do talude	3	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
3	● Plantio de Grama	Remoção de gramas mal instaladas	3	Concluída	100%
4	● Terraplanagem	Nivelamento do solo	3	Pendente	—
5	● Plantio de Grama	Replante das gramas mal instaladas	3	Concluída	100%
6	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	1	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO

Platô — Frente ao Prédio Administrativo



2 de jul. de 2026 16:51:17 Foto 1 de 4

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1721S/46.9488W
🕒 16:51 — 02/07/2026
📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Medeiros, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Terraplanagem	Remoção de materiais espalhados	1	Concluída	100%
2	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	1	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Platô — Frente ao Prédio Administrativo



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão


- ⊕ 23.1721S/46.9488W
- 🕒 16:51 — 02/07/2026
- 📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Medeiros, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Terraplanagem	Remoção de materiais espalhados	1	Concluída	100%
2	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	1	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Platô — Frente ao Prédio Administrativo

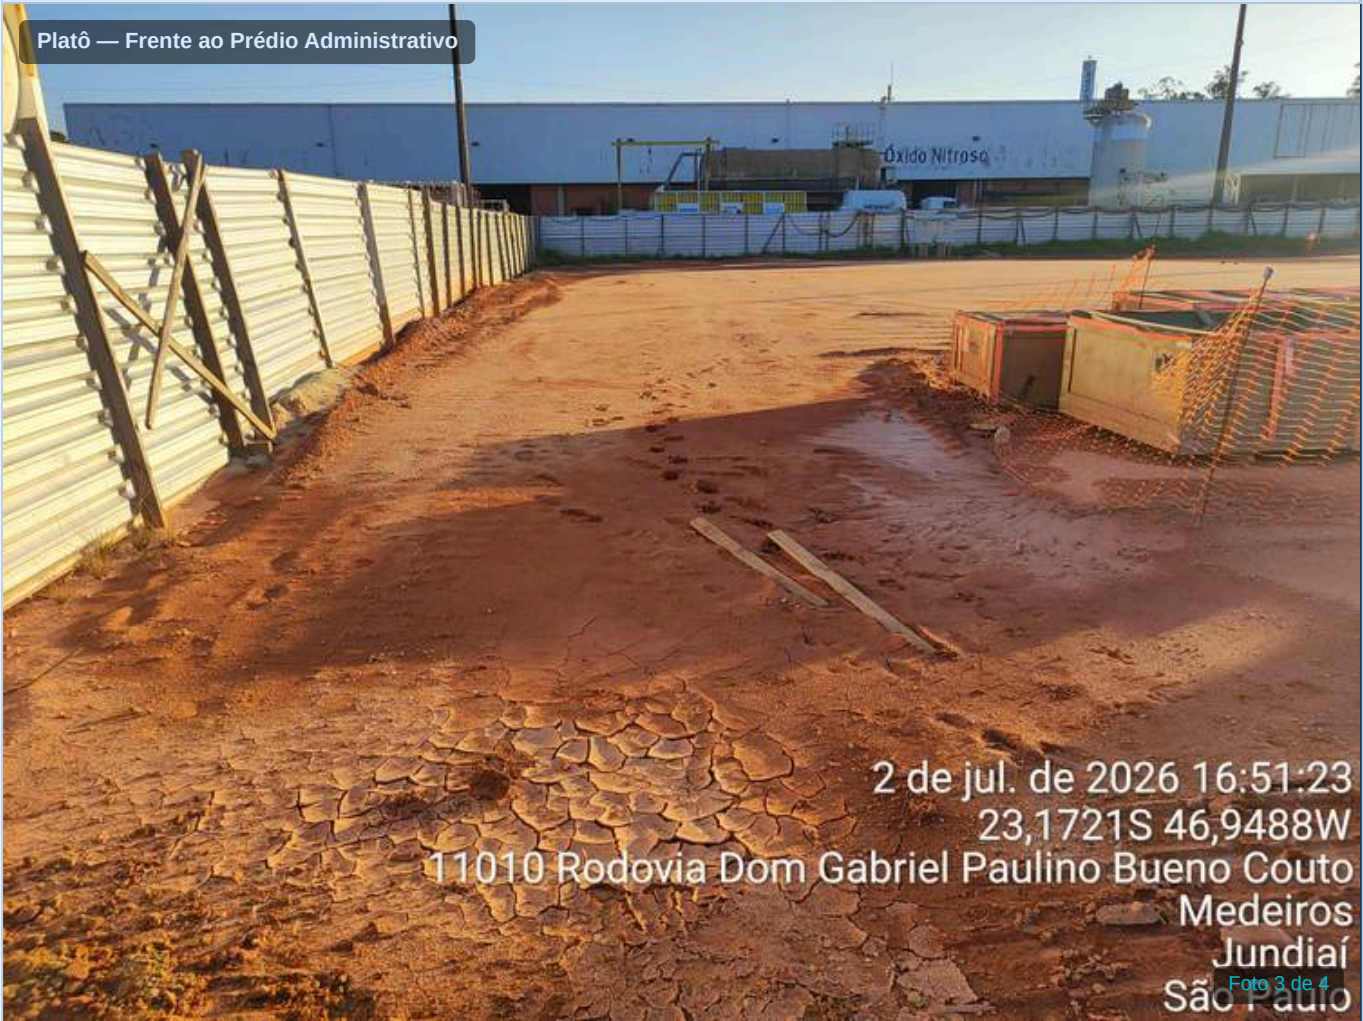

2 de jul. de 2026 16:51:23
23,1721S 46,9488W
11010 Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto
Medeiros
Jundiaí
São Paulo

Foto 3 de 4

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1721S/46.9488W
- 🕒 16:51 — 02/07/2026
- 📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Medeiros, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Terraplanagem	Remoção de materiais espalhados	1	Concluída	100%
2	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	1	Concluída	100%

CARD 34

Local 15

Platô — Frente ao Prédio Administrativo

100%

2 concl.

0 pend.

ANTES / LEVANTAMENTO

Platô — Frente ao Prédio Administrativo



Foto 4 de 4

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1721S/46.9488W
- 🕒 16:51 — 02/07/2026
- 📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Medeiros, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Terraplanagem	Remoção de materiais espalhados	1	Concluída	100%
2	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	1	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Platô Central



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1712S/46.9491W – 23.1710S/46.9494W
- 🕒 09:36 — 03/07/2026
- 📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 + Av. Pref. Luís Latorre, 9450 — Jundiá/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Remoção de Canaletas	3	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Terraplanagem	Regularização e adensamento do Platô Central	3	Pendente	—
3	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	1	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

Platô Central



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

- ⊕ 23.1712S/46.9491W – 23.1710S/46.9494W
- 🕒 09:36 — 03/07/2026
- 📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 + Av. Pref. Luís Latorre, 9450 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Remoção de Canaletas	1	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Terraplanagem	Regularização e adensamento do Platô Central	3	Pendente	—
3	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	1	Concluída	100%

CARD 37

Local 16

Platô Central

57%

2 concl.

1 pend.

ANTES / LEVANTAMENTO

Platô Central



PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ 23.1712S/46.9491W – 23.1710S/46.9494W

🕒 09:36 — 03/07/2026

📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 + Av. Pref. Luís Latorre, 9450 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● Macrodrenagem	Remoção de Canaletas	3	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● Terraplanagem	Regularização e adensamento do Platô Central	3	Pendente	—
3	● Geral / 5S	Limpeza geral e reorganização da área	1	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



⊕ —

🕒 07/07/2026

📍 Av. Pref. Luís Latorre, 9450 — Setor Industrial, Jundiaí/SP

0%
AVANÇO FÍSICO

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV	1	Pendente	0.0%

CARD 39

Local C02

Talude do Platô — Frente à Bacia

100%

1 concl.

0 pend.

ANTES / LEVANTAMENTO

Talude do Platô — Frente à Bacia



Foto 1 de 1

PÓS / REALIZADO



Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ —

🕒 07/07/2026

📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 6250 — Jundiaí/SP




100%

AVANÇO FÍSICO

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Abertura de vala e enterramento do cabeamento do Sistema de CFTV	1	Concluída	100%

ANTES / LEVANTAMENTO

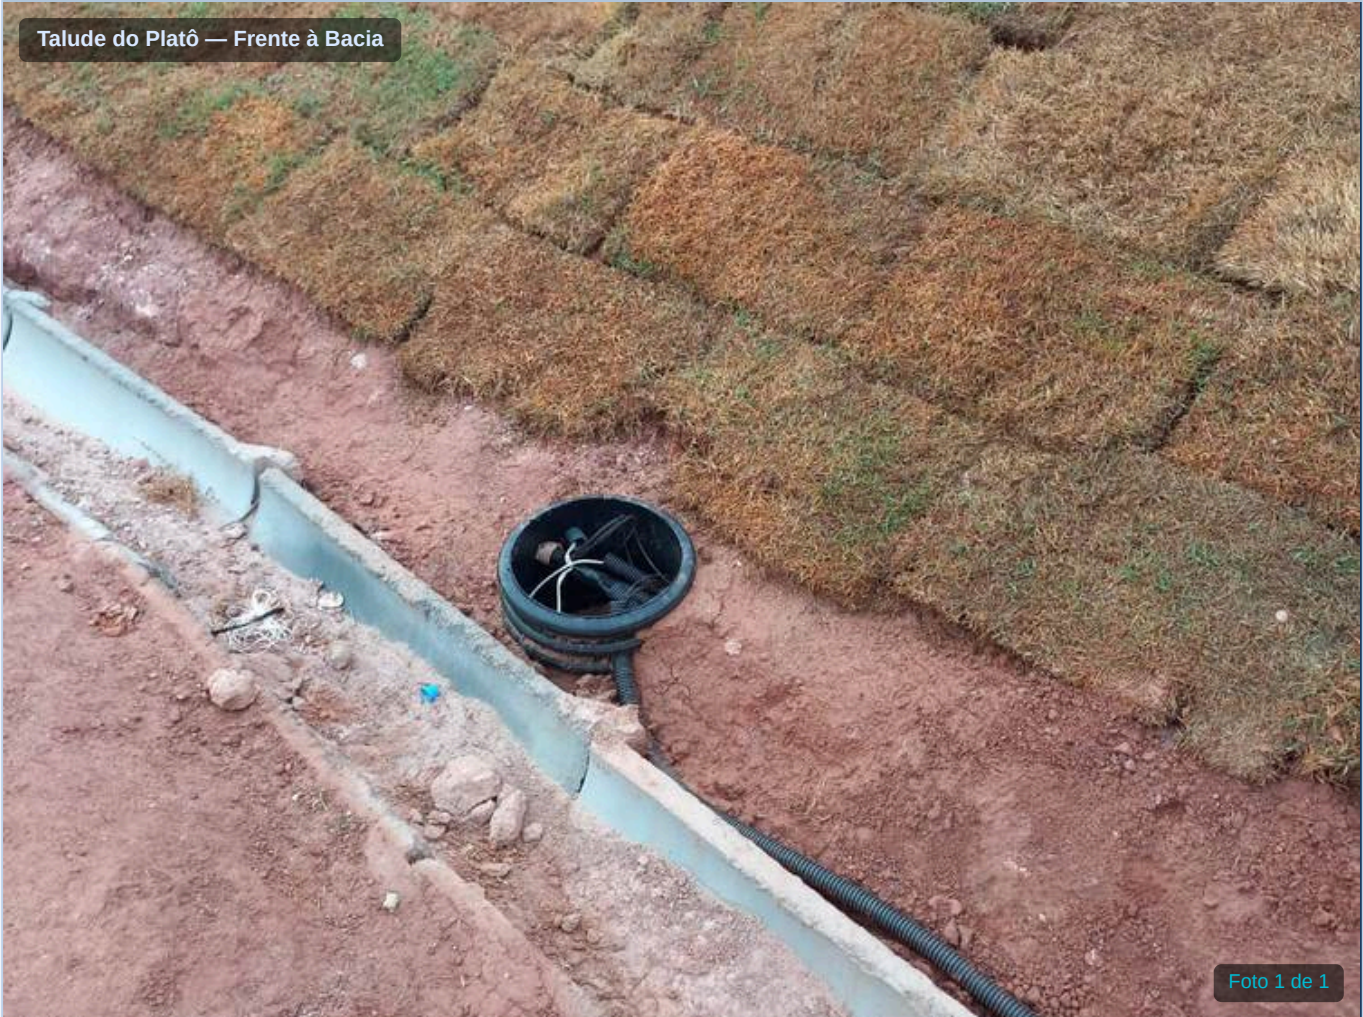

PÓS / REALIZADO



⊕ —

🕒 07/07/2026

📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Medeiros, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Abertura de vala e enterramento do cabeamento do Sistema de CFTV	1	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● CFTV	Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV	1	Pendente	—

CARD 41

Local C04

Caixa de Interligação 2

0%

0 concl.

1 pend.

ANTES / LEVANTAMENTO

Caixa de Interligação 2



Foto 1 de 1

PÓS / REALIZADO




Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ —

🕒 07/07/2026

📍 Av. Pref. Luís Latorre, 9450 — Setor Industrial, Jundiaí/SP



0%

AVANÇO FÍSICO

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV	1	Pendente	0.0%

CARD 42

Local C05

Berma Externa — Acomp. da Rua — Frente ...

0%

0 concl.

1 pend.

ANTES / LEVANTAMENTO

Berma Externa — Acomp. da Rua — Frente à Bacia



Foto 1 de 1

PÓS / REALIZADO




Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ —

🕒 07/07/2026

📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Medeiros, Jundiaí/SP



0%

AVANÇO FÍSICO

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Abertura de vala, lançamento e enterramento do cabeamento do Sistema de CFTV	1	Pendente	0.0%

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



⊕ —

🕒 07/07/2026

📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 6250 — Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV	1	Pendente	0.0%

ANTES / LEVANTAMENTO




PÓS / REALIZADO



⊕ —

🕒 07:45 — 07/07/2026

📍 Av. Pref. Luís Latorre, 9450 — Setor Industrial, Jundiaí/SP



0%
AVANÇO FÍSICO

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV	1	Pendente	0.0%

CARD 45

Local C08

Talude / Berma / Platô — Portaria Provisória

0%

0 concl.

1 pend.

ANTES / LEVANTAMENTO

Talude / Berma / Platô — Portaria Provisória



Foto 1 de 1

PÓS / REALIZADO




Foto Pós

Aguardando Conclusão

 —

 07:45 — 07/07/2026

 Av. Pref. Luís Latorre, 9450 — Setor Industrial, Jundiaí/SP




0%

AVANÇO FÍSICO

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	CFTV	Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV	1	Pendente	0.0%

ANTES / LEVANTAMENTO

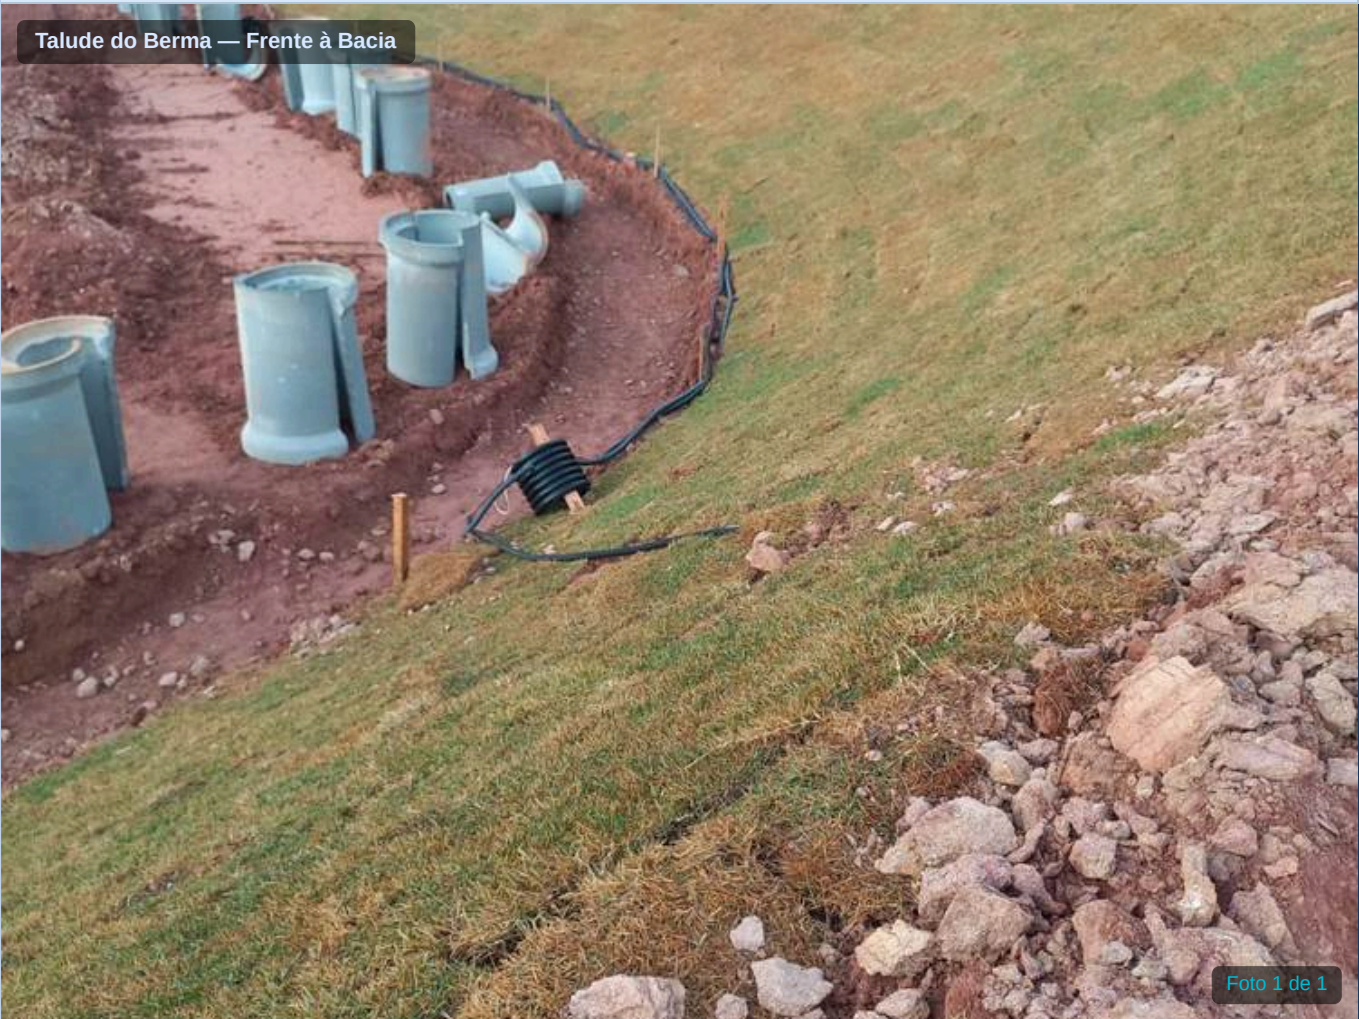

PÓS / REALIZADO



⊕ —

🕒 07:34 — 07/07/2026

📍 Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 11010 — Medeiros, Jundiaí/SP



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Abertura de vala e enterramento do cabeamento do Sistema de CFTV no talude	2	Concluída	100%

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
2	● CFTV	Finalização da instalação da caixa de passagem do Sistema de CFTV	2	Concluída	100%
3	● CFTV	Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV	1	Pendente	—

ANTES / LEVANTAMENTO




PÓS / REALIZADO



⊕ —

🕒 07:46 — 07/07/2026

📍 Av. Pref. Luís Latorre, 9450 — Setor Industrial, Jundiaí/SP



0%

AVANÇO FÍSICO

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV	1	Pendente	0.0%

ANTES / LEVANTAMENTO



PÓS / REALIZADO



⊕ —

🕒 07/07/2026

⊞ —



#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV	1	Pendente	0.0%

ANTES / LEVANTAMENTO

Caixa de Interligação 7



Foto não disponível

PÓS / REALIZADO




Foto Pós

Aguardando Conclusão

⊕ —

🕒 07:31 — 07/07/2026

📍 Av. Marginal, 65 — Setor Industrial, Jundiaí/SP



0%
AVANÇO FÍSICO

#	DISCIPLINA	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO	PESO	STATUS	CONCLUSÃO
1	● CFTV	Instalação da Tampa da Caixa de Interligação do Sistema de CFTV	1	Pendente	0.0%
